




Métodos de Estimativas de Histórias e a Técnica de *Planning Poker*


Profs Ivan Granja

1

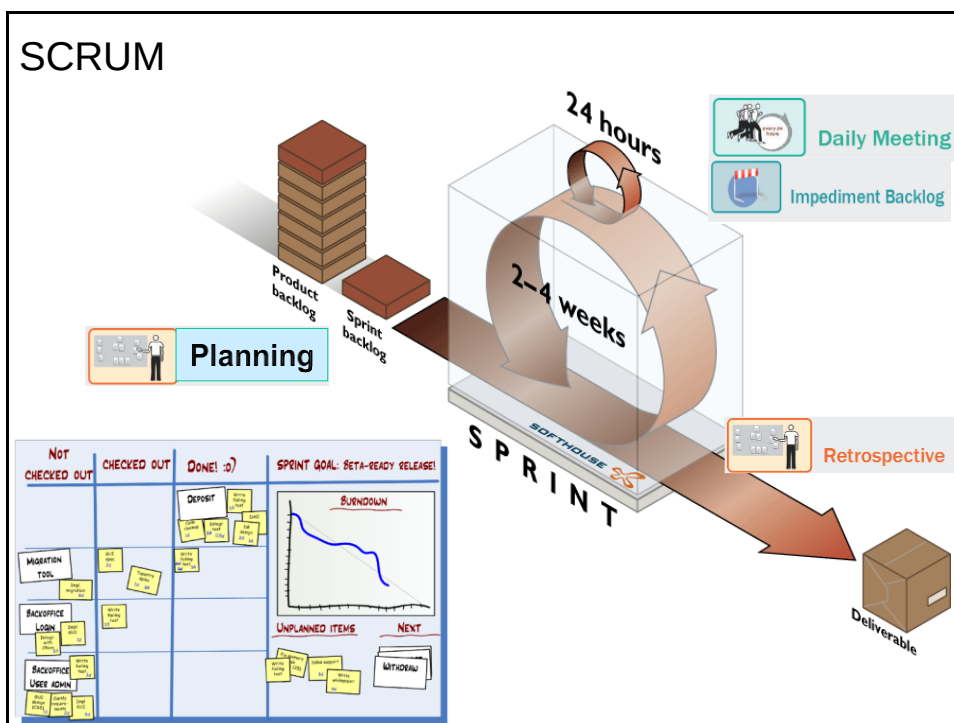


2

SCRUM – Cerimônias e Artefatos

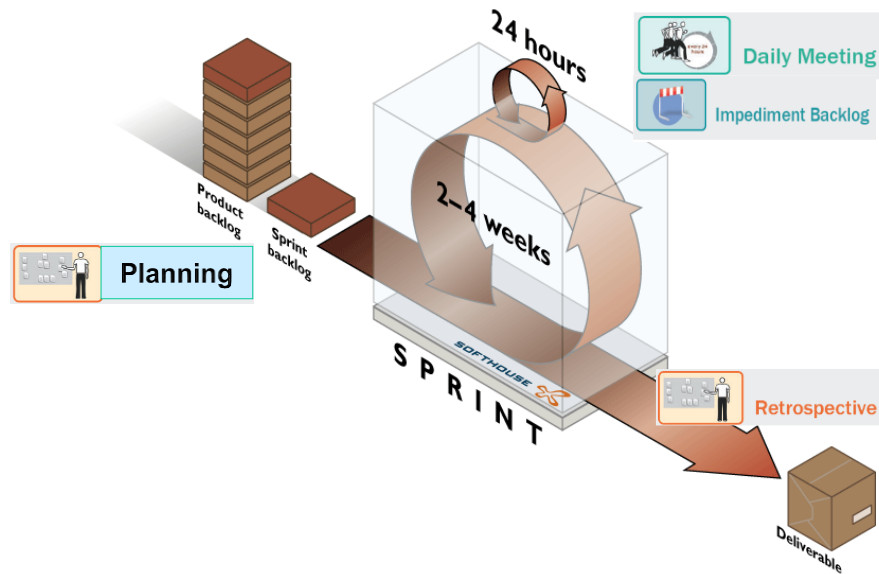

3

SCRUM – Quadro KanBam e *BurnDown* Chart

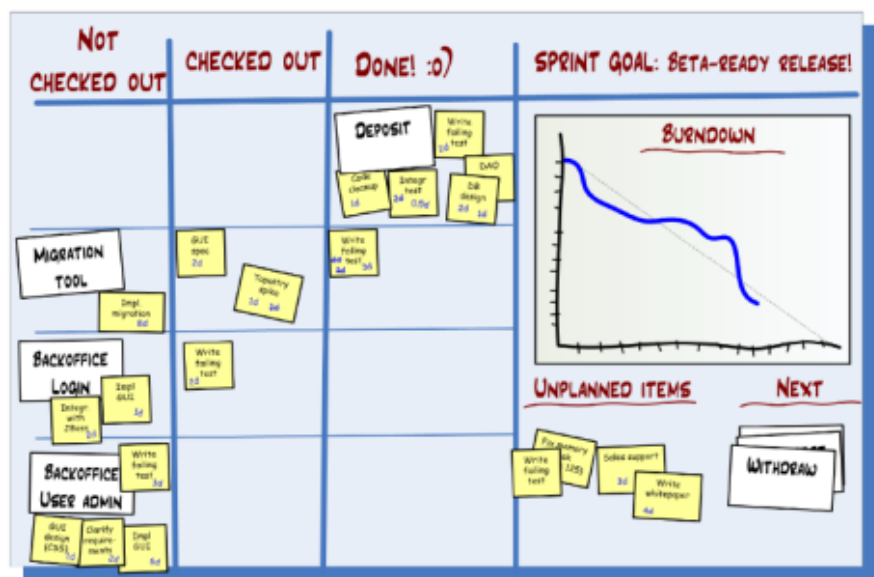

4

Story Points

- É uma medida **subjetiva** de estimativa utilizada por times Ágeis para estimar as User Stories
- Subjetiva = indireta. Não de apoia em valores mensuráveis diretamente no produto final como:
 - nº de Linhas de Código (KLOC)
 - quantidade de memória ocupada
 - Nº de tabelas no banco de dados
- Representa a quantidade de esforço requerido para implementar uma história
 - Também pode ser entendido como uma medida de complexidade (da história)

5

Story Points

- A estimativa de pontos deve considerar a quantidade de esforço necessário para se concluir todas as atividades (a determinar) da história:
 - Desenvolvimento, teste, liberação, para posterior aceitação (homologação do usuário)
 - Correções após aceitação serão novas tarefas
 - A princípio, considerar estimativa do cenário feliz
 - O trabalho será realizado continuamente, sem interrupções e com disponibilidade de todos recursos necessários.
- Os pontos utilizados são os da série de Fibonacci.
 - 0, 1/2, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 e 100.
 - '?', se existirem dúvidas que não permita estimar


6

Por que estimar com *Story Points*

- São comparáveis com uma **história padrão**, que:
 - Tenha sido feita pelo time
 - Tenha sido acompanhada de perto na sua decomposição em tarefas e no tempo usado (dias, horas, etc.)
 - Time tenha consenso em defini-la como seu padrão
- O padrão pode mudar, pois a produtividade e o ritmo da equipe podem mudar com o tempo.
- Times estimarão mais rapidamente se não tiverem de analisar e “acertar” o exato número de horas/dias necessários para concluir uma atividade.
- Nas estimativas ágeis, leva-se em consideração o esforço coletivo por user story, não p/ membro do time

7

Comparando com um Padrão

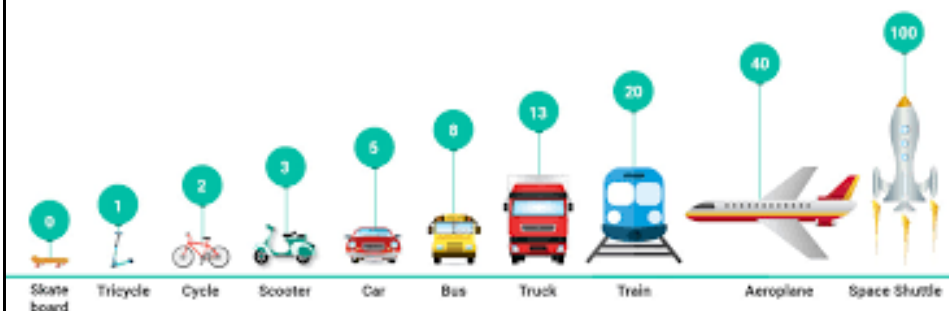

8

Método para Estimativa de Histórias

- Escolher a história padrão (ou a nossa régua)
 - A equipe pode iniciar separando as histórias qualitativamente (**simples**, **médias** e **maiores/complexas**):
 - Usar fibonnacci. 0, **1/2**, **1**, **2**, **3**, **5**, **8**, **13**, **20**, **40** e **100**.
 - Até o 13, o valor é a soma dos dois anteriores da série fibo original. **A partir de 20 os pontos são uma adaptação.**
 - Histórias pequenas (1 a 3 pts), médias (5 a 13 pts), etc..
- Uma boa prática é começar com uma história de tamanho médio, usando a pontuação como referência para histórias maiores e menores. Outros autores sugerem começar com a menor das histórias e usá-la como referência para as demais.
 - A pontuação de história média poderá variar entre 3 e 8 (5 o mais provável).
 - Para Simples, poderá variar entre 1 e 3 (2 o mais provável)

9

Método para Estimativa de Histórias

- Depois, pontuar e aplicar a projeção de pontuação para as demais histórias, usando a régua adotada (história padrão adotada).
- Pontuar e projetar cumulativamente pelas complexidades sempre em consenso, aplicando **planning poker** como técnica.
- A sequencia *fibonnacci* permite projetar resultados aceitos em consenso pelo time. Exemplos de projeção
 - Uma história complexa de 20 pontos pode equivaler ou estar próxima a duas histórias médias (de 13 e 8 pontos, cada).
 - Uma história muito complexa, de 40 pontos, pode equivaler a duas histórias complexas de 20 pontos.

10

Planning Poker

Dinâmica de grupo apresentado por James Grenning em 2002. Trabalha com a idéia de [consenso](#) para estimar esforço e tempo, utilizando-se de [histórias](#).



Doze homens e uma sentença (1957)

11

Planning Poker

- Participam todos os desenvolvedores da equipe do projeto. Para projetos ágeis uma boa prática é não exceder 4-8 participantes.
- Um dos participantes é o [MODERADOR](#) (*Scrum Master?*) que tem previamente preparada uma lista do [product backlog](#) apresentada pelo [Product Owner](#), na forma de cartões.

12


Planning Poker

Cada participante tem um baralho com a sequência de cartas (sequência de Fibonacci adaptada).
0, 1/2, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 50, 80, 100 e ?).



13

Baralho para Planning Poker

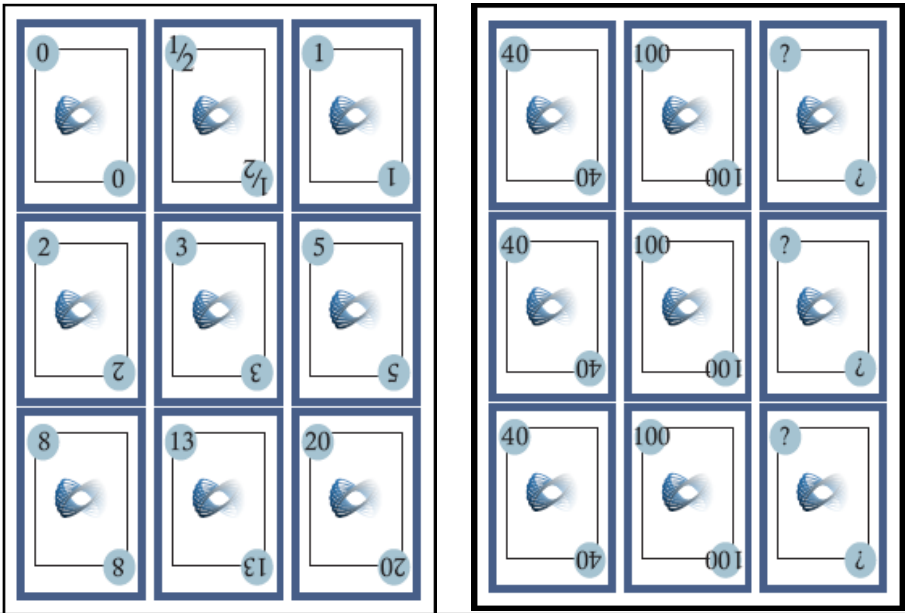

14

Planning Poker

1. Apresentar uma história: o Moderador inicia apresentando uma história (ou bloco temático) para ser estimado.


2. Conhecer detalhes da história:

Os presentes podem discutir detalhes da história (geralmente num tempo de dois minutos) para um entendimento geral. Os presentes conhecerão as cartas dos outros depois da votação.

15

Planning Poker

3. Definir STORY POINTS: O Moderador inicia a votação. Cada participante coloca na mesa uma carta (aberta) cujo valor na sua opinião corresponde com os story points da história.

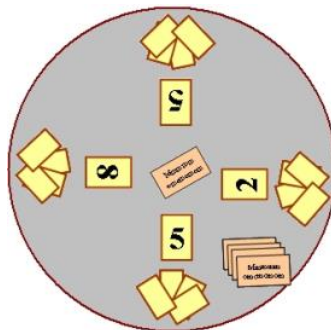

16

Planning Poker

4. Buscar o consenso: quando os resultados são discrepantes (em geral na primeira rodada), o Moderador **questionará os participantes com valores discrepantes** (2 e 8 no exemplo) para que expliquem suas razões (dificuldade, comparação com história semelhante, experiência, etc.).

Neste exemplo, a história em questão aparenta ser média, ou seja entre 5 e 13 pontos.

Cada participante explica, escuta e questiona, numa técnica de buscar o consenso entre os presentes.

17

Planning Poker

5. Rodadas de reestimativa: Em seguida é feita uma nova estimativa da história, até que haja consenso entre os participantes.

Caso não seja possível formar consenso num tempo razoável, o Moderador pode arbitrar um valor (**essa prática fere a regra do consenso**).

18

Planning Poker

6. Apurar story points da História padrão em IDEAL DAYS (ou HOURS) Esses dois passos não são consenso da comunidade. Converter de *story points* para *IDEAL DAYS*, considerando:


- Características técnicas, competências da equipe no atual estágio do projeto (curva de aprendizagem), na tecnologia e ferramenta, opinião do SCRUM MASTER.
- Adotar trabalho dedicado e sem interrupção e por toda a equipe

7. Apurar Tempo Real - ACTUAL DAYS (ou HOURS) para comparar estimado x realizado e assim calibrar as futuras estimativas da equipe.

19

Planning Poker

Ferramenta web (free) para *planning poker* com membros da equipe distribuídos em diferentes localizações. Há outras opções.



<http://planningpoker.com/>

20

Usar *Story Points* para estimar Sprint Backlog

- A estimativa individual de story points (por história) podem (não é regra geral aceita) dar referencias ou elementos para definir o que será selecionado para um Sprint backlog.
 - Os story points são estimados sem imprevisibilidades.
 - Todo Sprint terá imprevisibilidades (ou *unplanned tasks*), mas estas tendem a diminuir com o passar os sprints
- As histórias do Sprint backlog podem ser selecionadas a partir da soma das histórias de um Sprint terminado sem falhas ou por uma projeção aprox.de pontos da história padrão:
 - Um Sprint (time de 5 pessoas, 14 dias corridos) foi concluído sem falhas (sem folga e sem atraso), com todas as demais cerimônias (planning, review e daily) e produzindo os artefatos previstos (ex. burndown) um total de 61 pontos ($20 + 20 + 8 + 13 = 61$ pontos)
 - Nas mesmas condições, equivale aproximadamente a outros com 2 histórias simples ($1 + 2$ pontos) 4 histórias médias ($5 + 8 + 13 * 2 = 39$) e uma complexa (20 pontos), totalizando 62 pontos.
